

# Avviksforklaring 2022 - Investeringsregnskapet

## Investeringsprosjekter 2022 - talloppsett

Tall i hele tusen

Prosjekt		Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik
311002	Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 372	2 806	3 000	-1 434
313001	Datauts			3 000	-2 350
313002	Trollkirke			0	424
313003	Utvikling kommun			500	-813
313005	Tak på E			0	280
313008	Utvidels			2 500	646
313011	Automat			200	-400
313012	Fullførin			0	-249
313013	Nytt byg			0	195
313014	Utstyr ti			2 100	-536
313015	Renover			6 250	-1 018
313016	Badepla			0	-2 721
313017	Inventar			0	-2 053
314001	Familiens hus - Eide	2 174	6 612	6 900	-4 438
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	733	1 170	33 000	-437
321002	Uteområder barnehager	736	700	700	36
322003	Utbedring Tornes skole	8 401	15 000	4 000	-6 599
322004	Haukås skole	79 371	97 303	82 800	-17 932
322007	Uteområdet og trafikkisikringstiltak ved skolene og Eidehallen	588	636	0	-48
322018	Digitale hjelpemidler skole	844	1 000	1 000	-156
322019	Uteområder skoler	1 531	950	750	581
322020	Eide barneskole oppgradering uteområdet	159	2 000	2 000	-1 841
322021	Ny Eide barneskole	5 057	2 500	2 500	2 557
322023	Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	2 706	4 000	0	-1 294
331003	Varslingsanlegg mv.	1 759	5 568	6 000	-3 809

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

INNSTILLINGER

GODTA ALLE

Prosjekt		Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik
331006	Helseplattformen	1 001	2 000	2 000	-999
331007	Utstyr Helse og velferd	833	1 000	1 000	-167
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	10	10 000	10 000	-9 990
331010	Inventar Eide legesenter	600	600	0	0
333003	Digital hjemmeoppfølging	0	1 000	0	-1 000
333004	Ombygging avlastning Bøtunet	1 609	1 100	300	509
333005	Oppussing Slettatunet	527	700	0	-173
341002	Asfaltering og vei	15 871	16 000	16 000	-129
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	1 087	2 595	0	-1 508
341007	Justering mva Lauvåsen	138	138	0	0
341008	Kjøp gra			2 000	-42
341009	Gatelys			1 500	-682
341010	Drenerin			350	-350
341015	Oppgrad			2 500	445
342004	Parkerin			0	0
342007	Rundkjø			5 000	-457
344001	Ny bran			28 000	-21
344007	Bil - Fran			1 000	-535
344008	Røykdyk			800	-91
344009	Motorsp			250	-15
90001	Renover			7 000	-4 047
90002	Industri			20 000	-5 671
90003	Vatn			50 000	-446
90004	Avløp	7 183	15 000	22 000	-7 817
90005	Boligtomter	6 486	7 000	7 000	-514
<b>Sum</b>		<b>216 968</b>	<b>294 078</b>	<b>333 900</b>	<b>-77 110</b>

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

## Avviksforklaring investeringsprosjektene

### Innledende kommentar

Dette er en rapport fra regnskapet for 2022. Vær obs. på at alle prosjekt som ikke er ferdige blir tatt inn i Avstemmingsaken for investeringsprosjektene som kommer opp i FM 13.03 og vedtas i KS 30.03.23. I den saken blir ubrukte midler på ikke ferdige prosjekter i 2022 overført til ny bevilgning i 2023.

## Nytt regionsenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 1,4 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2022. Midlene er i all hovedsak brukt til utredninga av gatebruksplan og sentrumsplan. Prosjektet er nå ferdigstilt.

## Datautstyr:

Det ble kun brukt 650 tusen kroner av rammen på 3 mill. kroner i 2022. Det store mindreforbruket skyldes delvis at det er bevilget egne midler til digitale hjelpemidler skole. Dette har tidligere gått på dette prosjektet. Det skyldes nok også bemanningssituasjonen på IKT-avdelingen høsten 2022, og forventet overgang til ROR-IKT.

## Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Septiktank er kjøpt inn og er klar for monteringslegen bevilgninger i 2022. Ny bevilgning i 2023.

## Utvikling av tu

Det jobbes med utvikling av tu  
tid enn først antatt, p  
med 600 tusen kroner  
foreninger. Planen er  
del av arealet som er  
flere nye tiltak i omr  
- renovering ved Fa  
område.

- Utvikling på Langv  
hovedansvar i utvikl

- Utvikling av P-plass  
oppstart i 2023, og skal senest være klart til våren 2024.

- Etablering av Atlanterhavseggen, fra Trollkirka til Snipa/Nås er et stort prosjekt som vil kreve noe tilrettelegging. Jobbes med skilting/sikring av trase, parkeringsløsninger, stien fra Snipa og ned.

- Vikan friluftsområde; kommunalt område ved sjøen som settes i stand etter at VA-anlegget er ferdig. Prosjekter sammen med Vikan Velforening. Oppstart i 2023.

- Reetablering av Hauglia friområde med flere typer anlegg. kommunal eiendom, med gamle anlegg, ser vi sammen med lag og foreninger må renovere anleggene sammen. Sykkelbane, tennisbane, slalombakken, m.m.

- det er også mange mindre utviklingsprosjekter som ligger i dette arbeidet, som vil påvirke helheten på en god måte.

## Tak på Eidehallen:

Prosjektet har et merforbruk på 280 tusen kroner i 2022. Ny takpapp. Prosjektet er fullført i 2022.

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

## Utvidelse av gravplass Tornes:

Etter en forsinket oppstart ble prosjektet påbegynt vinteren 2021/22. Det er utført arbeid med drenering og stikkrenner i 2022. Prosjektet går videre inn i 2023.

## Automater til biblioteket:

Innkjøp av utlånsautomatene er utsatt fordi vi venter på et nytt BIB-system som kommer i 2023.

Utlånsautomatene må tilpasses dette.

## Fullføring av gravsted Hestaholen:

Det er et mindreforbruk på 249 tusen i 2022. Flettverksgjerdet er ferdig. Det skal settes opp en redimur og stor port nord for toalett til våren, samt en liten port. Det er et mindreforbruk på 249 tusen i 2022.

## Nytt bygg til b

Det ble 195 tusen kr

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

## Utstyr til utesc

Det er et mindrefork  
utstyr gjenstår i få ta  
prosjektet.

## Renovering Fr

Prosjektet har et mi  
ca halvveis.

Ferdigstilles i løpet av våren 2023.

## Badeplass Eide

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,7 mill. kroner. Det vil kreve regulering av området for å få igangsatt de planlagte tiltakene som var tiltenkt badeplassen. Administrasjonen har begynt arbeidet med å lage grunnlag for å sette prosjektleder for reguleringsarbeidet. Avviket er derfor forklart ved at man ikke har fått satt i gang tiltak i påvente av reguleringsarbeidet.

Noen enkle grep har blitt gjort på plassen, som ikke er søknadpliktige. Feks felling av trær, planering av deler av området.

## Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen

Det er 2 mill. kroner i mindreforbruk prosjektet. Kommunen hadde ikke mulighet til å bruke alle midlene i 2022. Inventaret til Elnesvågen blir ikke kjøpt inn før våren 2023. Resterende midler foreslås overført til 2023.

## Familiens Hus - Eide:

Det er et mindreforbruk på 4,4 mill. kroner på prosjektet i 2022. Det er hovedsakelig fordi utvendige arbeider, og innvendige arbeider skal lyses ut på en og samme entreprise. Vi mener at dette vil være beste for brukere, entreprenører, og budsjettet.

2.etg planlegges rehabilitert på en annen og mer hensiktsmessig måte enn 1. etg, siden vi nå vet mer om byggets tilstand.

Det er utarbeidet utkast til funksjonsbeskrivelse og tegninger for arbeidene, og det arbeides med innspill/brukermedvirkning til denne.

Midlene fra 2022 foreslås overført til 2023. Endelige tall vil ikke foreligge før entreprisen har vært ute på anbud. Rammen er justert, og totalrammen er på 40 mill. kroner.

## Kulturskole - H

Dette prosjektet har  
totalentreprise. Tekn

## Uteområder b

Pengene som er be

## Utbedringer T

Det er et mindrefork  
konsekvens av geot  
gytesesong. Noe gj

## Haukås skole:


Regnskapet viser et mindreforbruk på 17,9 mill. kroner i 2022. Prøvedriftsperioden ble satt i gang etter overtakelse av bygget med utomhusområdet, altså 3. oktober 2022. Prøvedrift varer i 12 måneder. Det vil påløpe noen kostnader i 2023 til evt. forbedringer av teknisk anlegg samt endelig sluttoppgjør etter prøvedriftens slutt.

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

bud om

ende ramme er  
må skje utenfor

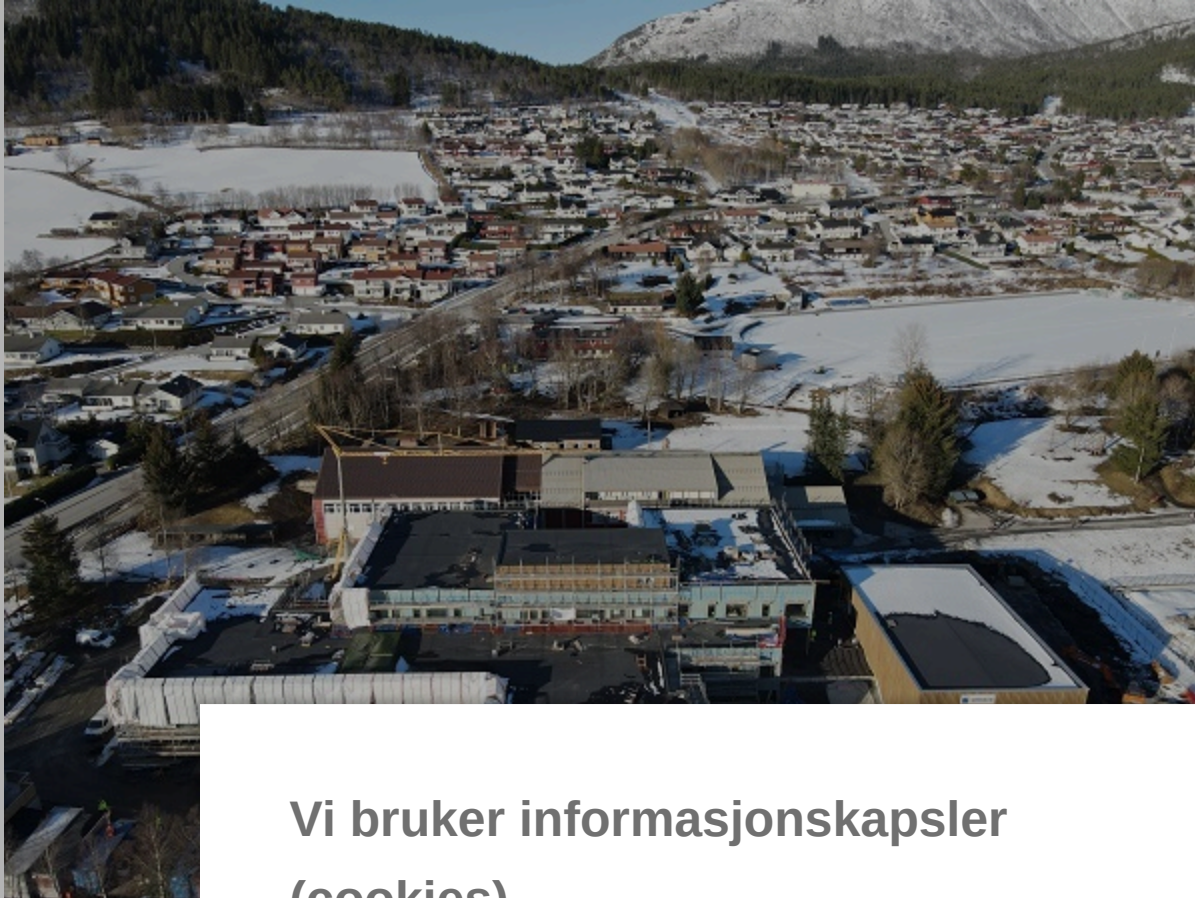

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

Bygging nye H



## Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 40 tusen kroner i 2022. Steinlegging og asfaltering ble ferdig i november, og det gjenstår å plante noen trær. Dette kan utføres til våren 2023.

## Uteområder skoler

Det er et merforbruk på prosjektet på 581 tusen kroner i 2022. Det meste har gått med til kunstgressbane, utebod og gjerder på Jendem skole.

Dette pga oppriving av ny asfalt lagt for 2 år siden, ca 600m<sup>2</sup>, samt drenering og underlag for kunstgress. Lyktestolper og fundamenteringer til fangnett samt fotballmål.

## Eide barneskole og ungdomsskole og Eidehallen

Her er det et mindre forbruk på prosjektet på 1,3 mill. kroner i 2022. Det gjenstår å bygge ut Eidehallen. Det legges inn tiltak så som utvidelse av Eidehallen og Eidehallen skal bli. Det

## Ny Eide barne

Prosjektet har et merforbruk på prosjektet på 1,3 mill. kroner i 2022. Det gjenstår å bygge ut Eidehallen. Det legges inn tiltak så som utvidelse av Eidehallen og Eidehallen skal bli. Det

Det jobbes med å h... Eide

Vi holder vedtatte fr... etterfølges av

samspillsfase og detaljprosjektering. Byggestart juni 2021 innflytning desember 2023. 1 års prøvedrift.

Ferdigstillelse av prosjekt: 1. desember 2026.

## Renovering teknisk rom svømmehall FUSK

Prosjektet har 1,3 mill. kroner i mindreforbruk i 2022. Renovering av teknisk rom til bassenget er stort sett ferdig. Gjenstår å montere en varmeveksler samt kompressor for å få utnyttet 25 kw gratis fra varmepumpa. Monteres i vinterferien 2023.

## Varslingsanlegg m.v.

Prosjektet har et mindreforbruk på 3,8 mill. kroner i 2022. Pasientvarslingsanlegget ved Lundhaugen omsorgssenter er ikke ferdig. Beregnet ferdig i april 2023. Dette er et prosjekt som bidrar til bedre kvalitet og økt sikkerhet for beboere og ansatte. Rammen totalt skal holde.

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

## Helseplattformen

Prosjektet har et mindreforbruk på 1 mill. kroner i 2022. Det er kun prosjektlederlønn som er belastet i 2022.

Oppstart prosjektet ble utsatt med 6 måneder. Dette prosjektet løper videre inn i 2023.

## Utstyr Helse og velferd

Prosjektet har et mindreforbruk på 167 tusen kroner i 2022.

## Omsorgsleiligheter Farstad

Prosjektet har et mindreforbruk på 10 mill. kroner i 2022. Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet i 2022 og det blir videreført i 2023.

## inventar Eide leagesenter

Utgiften er som bud

## Digital hjemme

Det er ikke påløpt u

## Ombygging av

Det er 509 tusen kro  
funksjonelle lokaler

## Oppussing Sle

Prosjektet har et mindreforbruk på 175 tusen kroner og er ferdig.

## Asfaltering og vei:

Budsjettet for 2022 er brukt etter oppsatt plan.

## Vei - Høstmarkeiendommen - Boligfelt/utbygging sør for hovedveien:

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner i 2022. Dette er kostnader til advokat i forbindelse med ekspropriering av eiendom. Andre grunnavtaler regulerings kostnader og prosjekterings kostnader. disse kostnadene var det vanskelig å anslå eksakt så tidlig i prosjektet.

Resterende foreslås flyttet til 2023.

## Kjøp gravemaskin

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

mer arbeid for å få

Det ble i 2022 kjøpt en ny gravemaskin ( CAT 310 ) og ny tralle / henger til lastebil i fra denne investerings potten. Totalt så kom dette på 1958 000. Investeringsbudsjettet var på 2 mill.

## Gatelys

Det var avsatt 1.5 mill. til renovering av gatelys langs Strandvegen ( Storlandet ) i 2022. Armaturer er innkjøpt og arbeid med renovering er så vidt påbegynt. Det er kun fakturert 818 000 på denne i 2022. Pengene foreslås videreført til 2023.

Årsaken til at prosjektet ikke er fullført er kapasitets problemer i egen avdeling. Det har vært prioritert andre prosjekter som ikke har vært så store men som har vært viktige for å sikre myke trafikanter.

## Drenering Gaustad kapell

Det har vært en del utfordringer med gjennomføring av prosjektet. Dette har nå løst seg og det vil bli oppstart med drenering av området i 2023.

## Oppgradering

Prosjektet viser et m

## Rundkjøring i l

Prosjektet hadde et

rundkjøring på Hola

Det er kun regulering

Reguleringsplan er i

## Miljøtiltak:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 286 tusen kroner i 2021. Midlene er brukt til elbilladere i 2021.

## Ny brannstasjon Eidem:

Det er politisk vedtatt at prosjektet skal utsettes til 2024.

Budsjett 2022 ble justert i henhold til tidligere rapportering, og er så godt som oppbrukt.

Prosjektet er ikke ferdig, og det er lagd saksfremlegg for ny politisk behandling med flere alternativer for videre fremdrift i prosjektet.

## Bil - Framskutt enhet:

Det ble investert i kun ett kjøretøy til Bud brannstasjon, selv om vi så på muligheten og også bytte ut et kjøretøy til Eide brannstasjon.

Utbytting av kjøretøy til Eide ansees ikke som nødvendig p.d.d.

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

## Røykdykkerutstyr og bekledning

Investeringen er fullført og innenfor ramme

## Motorsprøyter og lenser

Investeringen er fullført og innenfor ramme

## Renovering:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 4 mill. kroner i 2022. Det er et stort etterslep i vedlikehold i eiendomsporteføljen, men enheten har begrenset kapasitet til å få gjennomført alt. De midlene som er brukt i 2022 har gått til de mest presserende sakene. I 2022 er det brukt penger på sykkelskur på Hustad barne- og ungdomsskole, taklekkasjer på Eide Sykehjem, Haugli terrasse 7, Bytte av vinduer på Fræna ungdomsskole, nytt gjerde Tornes barnehage og uteområde Eide barnehage

## Industriomter:

Det er brukt 5,7 mill.

- Indre Harøy. Her er pågår. Utfylling av a med grunneiere på resterende pågår.

- Dalemyra bransje s

- Varhol Industriomr

Her er det dukket opp opprettet kontakt m områder.

Forlengelse av veg for å få frigjort 4 nye tomter er gjennomført.

- Holamyra industriområde.

Her er det reguleringsendring på gang.

- Grunnforhandlinger i Vestavika industriområde er ikke fullført i sin helhet. Dette vi bli gjennomført i løpet av vinteren 2023.

## Vatn:

Det er brukt 446 tusen kroner mindre enn budsjettet i 2022. De 2 største prosjektene er Høydebassengene på Skarsetbotten og Freneidet

Skarsetbotten blir ferdigstilt i slutten av November 2022. Freneidet blir ferdigstilt september 2023. Vikan blir ferdigstilt til mars 2023

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

av industriområde  
unntak forhandlinger  
inger med de

ns dager. Det er  
kartlegge slike

## Avløp:

Det er brukt 7,8 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2022. Slamavskiller på Indre Harøy som skulle vært under bygging blir forsinket etter ønske om utredning av alternative løsninger for håndtering av slam. Dette er et ønske i fra Salmon Evolution. Verdi på denne er ca 3 mill.

Flere av anleggene var tenkt oppstart på i 2022 men har stoppet opp på grunn av mindre endring i regulering ,grunnkjøp eller forsinket prosjektering. Vi har mange prosjekt som er klare for utførelse i 2023.

## Boligtomter:

På prosjektet ble det er mindreforbruk på 514 tusen kroner. Midlene er brukt til reguleringsendring Tornes boligfelt, Kjøp av Holten eiendommen g.nr. 46 Bnr. 29 og kjøp av areal til Haukås Øvre øst.

## Bevilgning investering 2022 – talloppsett

Tall i hele tusen

			Oppr. budsjett 2022	Avvik 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler			333 900	77 111
2 Tilskudd til andre kommuner			0	0
3 Investeringer i aksjer og andre finansielle instrumenter			3 000	-7
4 Utlån av egne midler			0	0
5 Avdrag på lån			0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>			<b>336 900</b>	<b>77 104</b>
7 Kompensasjon for utlån av egne midler			43 090	5 540
8 Tilskudd fra andre kommuner			10 725	2 351
9 Salg av varige driftsmidler			8 000	-933
10 Salg av finansielle anleggsmidler	18	0	0	-18
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	178 175	248 345	272 085	70 170
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>216 968</b>	<b>294 078</b>	<b>333 900</b>	<b>77 110</b>
15 Videreutlån	20 522	30 000	20 000	9 478
16 Bruk av lån til videreutlån	20 522	20 000	20 000	-522
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 624	5 000	5 000	-624
18 Mottatte avdrag på videreutlån	3 817	5 000	5 000	1 183
<b>19 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>1 807</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>8 193</b>
20 Overføring fra drift	-9	0	0	9
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	9	0	0	-9

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Oppr. Budsjett 2022	Avvik 2022
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1 807	-10 000	0	-8 193
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 707	-2 700	-3 000	7
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
<b>26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-4 514</b>	<b>-12 700</b>	<b>-3 000</b>	<b>-8 186</b>
<b>27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

## Avviksforklaring investeringsinntekter

### Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 77 mill. kroner på investeringsprosjekter i 2022.

### Tilskudd til andre:

Intet avvik av betydning.

### Investering i anlegg:

Intet avvik av betydning.

### Kompensasjon:

Kommunen fikk 5,5 mill. kroner mindre enn budsjettert i MVA-kompensasjon i 2022. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

### Salg av varige driftsmidler:

Det ble 1 mill. mer inntekter på salg av varige driftsmidler i 2022.

### Tilskudd fra andre:

Kommunen tilbakeførte et tilskudd som var dobbeltført i 2021 på 3,1 mill. kroner. Kommunen mottok i 2022 2,3 mill. kroner fra Enova og miljødirektoratet på Haukås skole.

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

er for hvert

## Bruk av lån:

Det er brukt 70,2 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettet i 2022. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettet på de forskjellige investeringsprosjektene.

## Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 9,5 mill. kroner mindre enn forventet til startlån i 2022.

< Avviksforklaring 2022 -

Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne >

Drift

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**
